


1. Kenndaten des Projekts

Terminrahmen	2. Bauvorhaben	Kostenrahmen / Budget	2. Bauvorhaben	Flächen	Gesamt HTS (1.-3. BV)
Planungszeit [Lph 1-5]	11/2016 - 12/2018	KG 300-600	6.202.368 €	BRI [m²]	30.027 m²
A+V [Lph 6-7]	01/2019 - 01/2020	KG 700	1.577.985 €	BGF [m²]	7.709 m²
Ausführung / 1. BA [Lph 8]	08/2019 - 09/2020	Gewerke außerhalb KB	724.710 €	Erweiterung BGF [m²]	3.211 m²
Ausführung / 2. BA [Lph 8]	07/2020 - 09/2021	Puffer	2.401.085 €	NUF [m²]	4.942 m²
Ausführung / 3. BA [Lph 8]	07/2021 - 09/2022	Gesamt	10.906.147 €	Umbau und Sanierung 2. BV BGF [m²]	4.398 m²




2. Termine

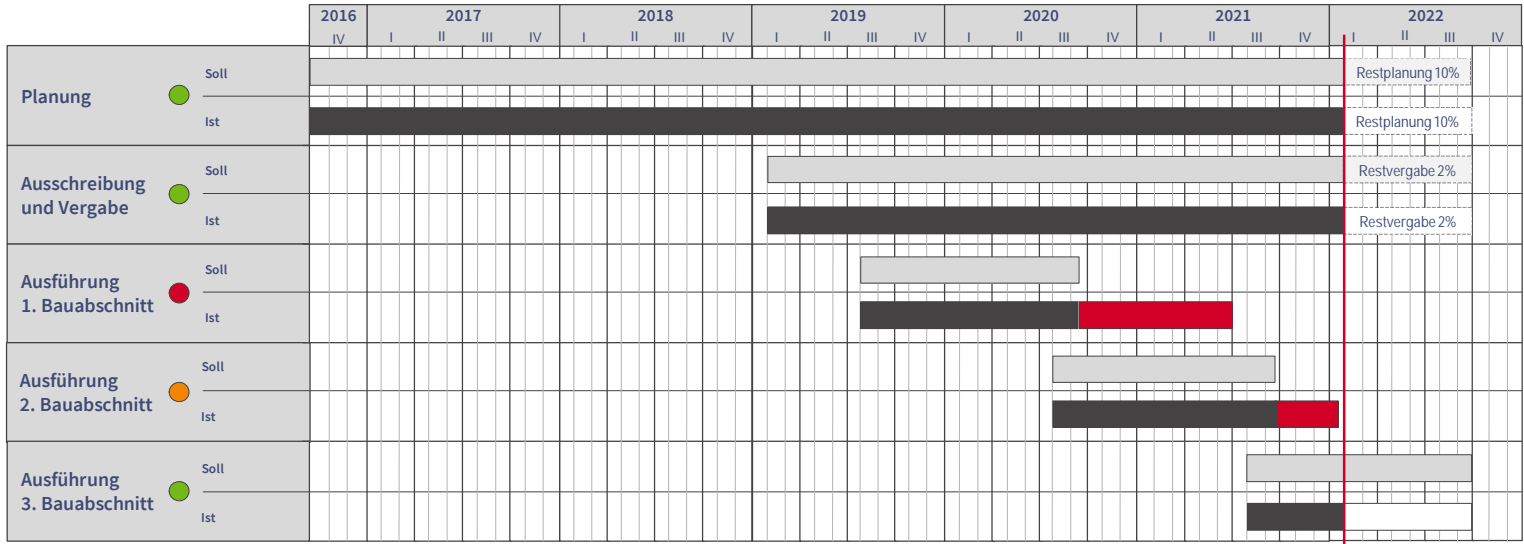

● bauliche Fertigstellung Zeitstrahl SOLL Zeitstrahl IST Zeit noch verfügbar Verzug erwartet Tatsächlicher Verzug ● prozentuale Abweichung kleiner als 5 % der Bauzeit ● prozentuale Abweichung kleiner gleich 10% der Bauzeit ● prozentuale Abweichung größer als 10 % der Bauzeit

3. Kosten

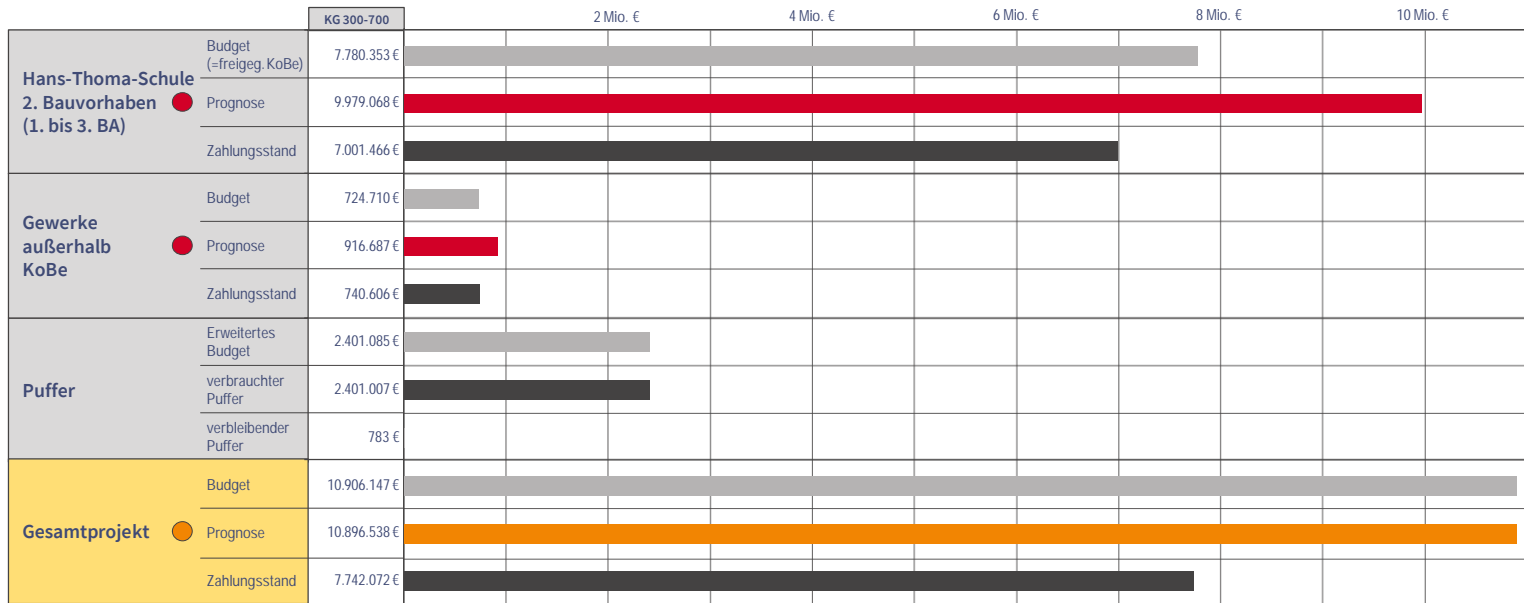

● absolute Abweichung kleiner als 500.000 € und prozentuale Abweichung kleiner gleich 2,5 % ● absolute Abweichung kleiner als 2.500.000 € oder prozentuale Abweichung kleiner gleich 10% ● absolute Abweichung größer als 2.500.000 € oder prozentuale Abweichung größer als 10 % Summe der freigegebenen Entscheidungsvorlagen, es liegt noch keine neue Gesamtkostenberechnung der Planer vor.

Bauforderungen / Vergabe / Ausschreibung	Projektorganisation / Planung / Ausführung	Kosten / Finanzierung	Termine
<ul style="list-style-type: none"> Folgende Nachträge/Hauptaufträge wurden beauftragt: <ul style="list-style-type: none"> Schoch: Reinigung Gußasphalt BBS-Zeiler: Beton bohren Buch Steinmetz: Sockelleisten Multimedia Display: Bildschirm Dreier: Tischlerarbeiten Einbauküche Fritz: Maler Sachverständiger Bernhard: Elektro Ochs: Breitbandkabel umlegen 3. BA Feuerstein: Lose Möblierung Lehrerzimmer Tremmel: Flucht- und Rettungspläne Folgende Nachträge sind zu erwarten/nicht noch beauftragt: <ul style="list-style-type: none"> Grafried: Abbruch WDVS der Südfassade Grafried: Rohbauarbeiten 3. BA Grafried: Abdichtung BA 1-2 Grafried: Abdichtung BA 3 Burkhart: Gerüst mit Folie verkleiden Vergaben: <ul style="list-style-type: none"> Die Ausschreibung der Außenanlagen erfolgt im Februar/März. Die Ausschreibung der WC-Trennwände erfolgt im März. 	<ul style="list-style-type: none"> Es findet eine Ausschreibung der Projektsteuerungsleistung statt. Bis zum Ergebnis der Ausschreibung wird die FC-Projektsteuerung monatsweise beauftragt. Die baurechtliche Abnahme des 2. BA hat am 30.09.2021 stattgefunden. Eine Nachbegehung der noch fertigzustellenden Bereiche erfolgte am 04.11.2021. Der Umzug in den 2. BA erfolgte ab dem 19.11.2021. Die Arbeiten des 3. BA hatten planmäßig im August begonnen. Die Bauleitung im 3. BA übernimmt Herr Benz, Weindel Architekten. Windbiel Architekten verlassen das Projekt nach Beendigung des 2. BA. 	<ul style="list-style-type: none"> Die Kostenprognose liegt über dem freigegebenen Budget, da einzelne Vergaben nicht innerhalb der Kostenberechnung gedeckt werden konnten, unvorhersehbare Arbeiten beauftragt werden mussten und Nachträge eingereicht wurden. Um Unvorhergesehenes im Bestand zu decken wurde der Puffer um 550.000 € erhöht (01.2021). Der verbleibende Puffer des Gesamtprojekts beträgt aktuell 783 €. Eine Erhöhung des Projektpuffers wird für weitere unvorhersehbare Änderungen und bereits vorliegende Nachträge notwendig. In der Gemeinderatssitzung am 22.02.2022 wird über die Puffererhöhung entschieden. 	<ul style="list-style-type: none"> Die Baurechtliche Abnahme des 1. BA ist erfolgt. Der Verzug des 1. Bauabschnitts liegt in unvorhergesehenen Maßnahmen, wie die Schadstoffsanierung begründet. Die Gesamtfertigstellung der Maßnahme wird durch den Verzug im 1. BA nicht beeinträchtigt. Die Fertigstellung des 2. BA erfolgte im Dezember 2021. Es wird für den 3. BA weiterhin von einer termingerechten Fertigstellung ausgegangen.
